



Producerad av BM KONSULT

ID	Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut	Föregående aktivitet	2006-04-17							2006-04-24							
						s	m	t	o	to	f	l	s	s	m	t	o	to	f	
1																				
2	Ältavägen 102, Nacka Gård	125 dagar	må 06-04-17	fr 06-10-06																
3																				
4																				
5	Etablering	2 dagar	må 06-04-17	ti 06-04-18																
6	Startmöte	1 dag?	ti 06-04-18	ti 06-04-18																
7	Rengörning av fasader	59 dagar	ti 06-04-18	fr 06-07-07																
8	Rengöring av fönster	31 dagar	fr 06-04-28	fr 06-06-09																
9	Snickeriarbeten	30 dagar	ti 06-04-25	må 06-06-05																
10	Grundmålning	19 dagar	ti 06-06-06	fr 06-06-30																
11	Semester	20 dagar	må 06-07-03	fr 06-07-28																
12	Grundmålning	10 dagar	må 06-07-31	fr 06-08-11																
13	Färdigstrykning	22 dagar	må 06-07-31	ti 06-08-29																
14	Tätninglistor	6 dagar	må 06-08-28	må 06-09-04																
15	Fönstervätt	2 dagar	må 06-09-04	ti 06-09-05																
16	Slutbesiktning	1 dag	on 06-09-13	on 06-09-13																
17	Avetablering	2 dagar	on 06-09-20	to 06-09-21																

PRODUKTIONSTIDPLAN

Projekt: Tidplan Ältavägen 102, Nacka
Datum: on 06-01-18

Aktivitet



Milstolpe



Externa aktiviteter



Delning



Sammanfattning



Extern milstolpe



Status



Projektsammanfattning




Tidsgräns





Producerad av BM KONSULT

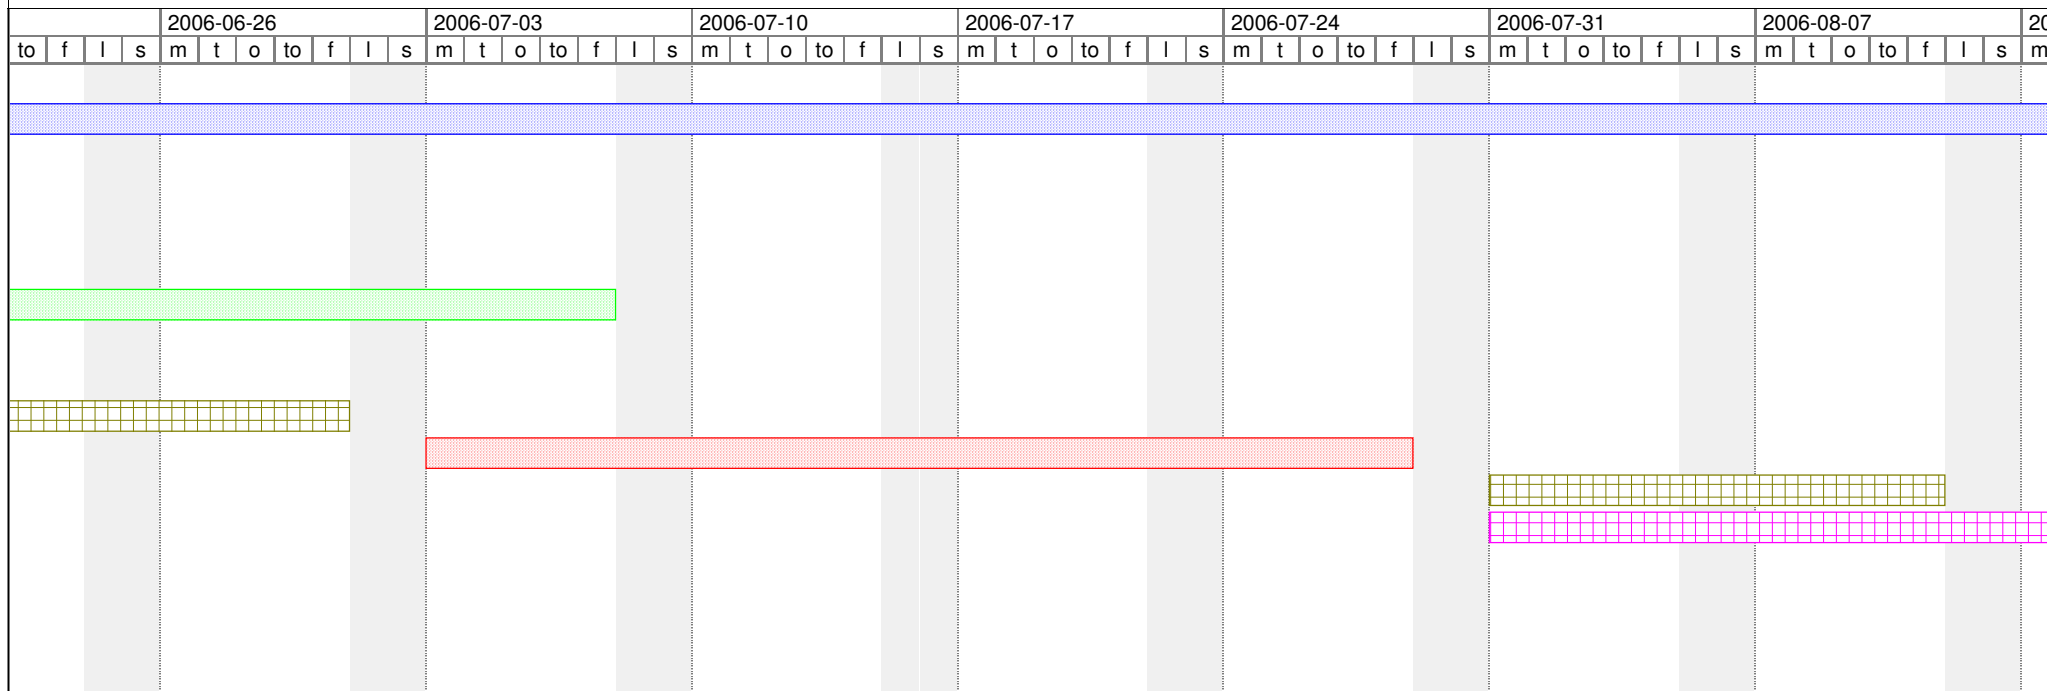

PRODUKTIONSTIDPLAN

Projekt: Tidplan Ältavägen 102, Nack
Datum: on 06-01-18

Aktivitet




Milstolpe



Externa aktiviteter



Delning



Sammanfattning



Extern milstolpe



Status



Projektsammanfattning




Tidsgräns





Producerad av BM KONSULT

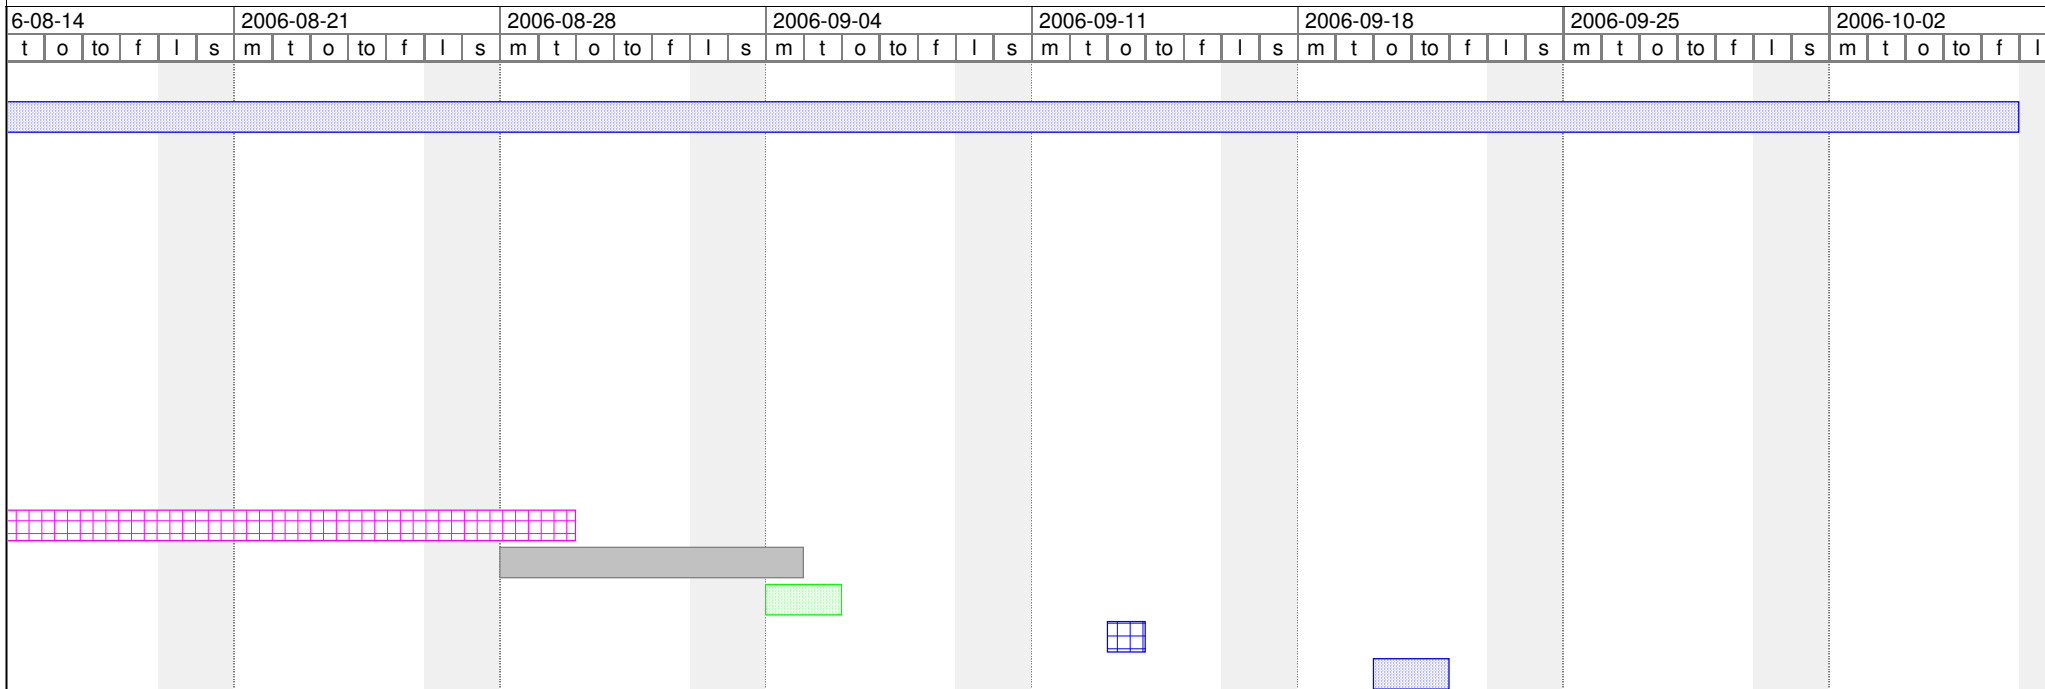

PRODUKTIONSTIDPLAN

Projekt: Tidplan Ältavägen 102, Nack
Datum: on 06-01-18

Aktivitet



Milstolpe



Externa aktiviteter



Delning



Sammanfattning



Extern milstolpe



Status



Projektsammanfattning



Tidsgräns

